

Turmsanierung: Stand Dezember 2022

Turmhelm

Die Arbeiten am Turmhelm sind abgeschlossen und das Gerüst wurde bis über dem ersten Umgang abgerüstet und als Wetterschutz überdacht.

Die Wasserspeier, welche aus der Bauzeit stammen, wurden unterhalb des oberen Umgangs wieder angebracht, wobei ein fehlender Originalgetreu nachgebaut wurde.

Original



Nachbau



Turmausgang Turmhelm

Der obere Ausgang wurde neu gebaut, der Ausstieg geht jetzt nach Norden und ist mit einer Stahltüre versehen und mit Kupferblech verkleidet.



Bleiarbeiten am oberen Umgang

Die Bestandsbleche sind an verschiedenen Stellen geschädigt (Risse) und die Übergangsstellen mit Silicon verfugt. Die Reparatur der Bestandsbleche und die Montage von Überhangstreifen an Stelle der Silikonfugen (Außenseite) erfolgt im Frühjahr 2023.

Risse



Silicon Fuge



Spenglerarbeiten, Bleiabdeckungen:

Die Verblechung der steilen Abdeckungen der Pfeilervorlagen wurden durchgeführt. Alle ehemaligen, nur mit Beton verkleideten Abdeckungen, sind jetzt mit einem Blei Dach versehen.



Glockenstube

Die Glockenspielhämmer für das Carillon sind montiert und an die Traktur angebunden. Die Glocke 6 (Paulanerglocke) ist montiert, angeschlossen und intoniert. Die Gesamte Anlage wurde nachgezogen und auf Festigkeit überprüft.



Fenster Westseite

Die Fenstereinlegerahmen und die historischen Quereisen sind konserviert. Die Verglasung ist wieder eingebaut.


Die Fensterrahmen an der Nord- und Südseite werden nicht ausgeglast. Diese werden mit Strahlschutzfolie abgedeckt, gereinigt und beschichtet.

Umgang Carillon-Ebene

Die Fialtürme sind alle eingebaut. Sobald die Ebene von Gerüstaufgaben befreit ist und die Witterung es zulässt, erfolgen die Arbeiten am Umgang.

Nordturm:

Die Arbeiten am Nordturm haben begonnen, hier sind jedoch erhebliche Schäden am Mauerwerk und der Bedachung zu beseitigen. Verrottendes Holz

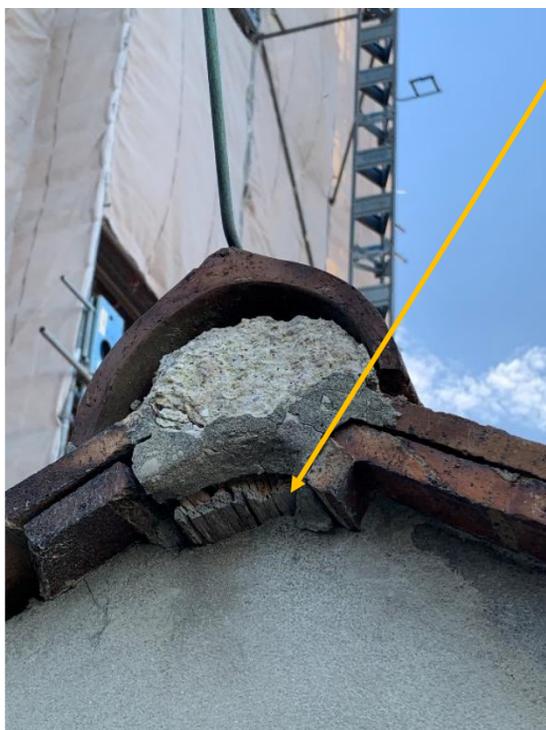

Verfugungsarbeiten, Natursteinarbeiten

Öffnen der Fugen Turmschaft > Ausführungsstand 95%
Verfugung Turmschaft > Ausführungsstand 80%
Einbau Wasserschläge > Ausführungsstand 90%

Hauptportal und seitliche Vorhallen:

Der Putz muss hier erneuert werden. Der alte Putz wurde im Hauptportal und dem nördlichen Eingangsportal abgeschlagen. Es wird geprüft, ob hier auf Entsalzungskompressen verzichtet werden kann. Wand- und Salzproben sind entnommen und werden untersucht.

Die Böden sind mit Holzplatten ausgelegt und das notwendige Arbeitsgerüst aufgebaut.

Die Putzarbeiten beginnen, sobald witterungsbedingt keine Arbeiten außen mehr durchgeführt werden können im Februar/März 2023. Ziel ist es die Arbeiten hier bis Ostern abzuschließen.

Die südliche Vorhalle wird erst bearbeitet, wenn der Zugang über Nordseite und Hauptportal wieder frei ist.



Für die Kirchenstiftung: Karl-Heinz Pronold
